



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



# Проектное управление в ПФР

**Елистратов Николай Витальевич**  
Заместитель Председателя Правления



# О Фонде

## Правление ПФР

Осуществляет руководство Фондом и реализует единую стратегию управления пенсионной системой России в соответствии с законодательством, определяет перспективные и текущие задачи ПФР, издает нормативные акты по вопросам деятельности Фонда в пределах своей компетенции.

## Исполнительная дирекция ПФР

Исполнительный орган Пенсионного фонда России, который осуществляет государственное управление средствами обязательного пенсионного страхования в России в соответствии с законодательством и решениями Правления ПФР.

## Ревизионная комиссия ПФР

Организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в системе ПФР и внутренний аудит эффективности деятельности ПФР.

## Центр персонифицированного учета ПФР

Осуществляет обработку информации по персонифицированному учету пенсионных прав граждан в системе обязательного пенсионного страхования и защиту этих сведений, обеспечивает автоматизированные процессы ведения системы персчета, ведет Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

## 84 отделения ПФР

Осуществляют организацию государственного управления средствами обязательного пенсионного страхования в соответствии с законодательством РФ, решениями Правления ПФР и Исполнительной дирекции ПФР.

## 2 500 управлений (отделов) ПФР

Находятся в подчинении отделений ПФР в субъектах РФ. Предоставляют государственные услуги ПФР участникам системы обязательного пенсионного страхования – гражданам и организациям.


## 11 Центров по назначению и выплате пенсии ПФР

Осуществляют деятельность под управлением отделений ПФР. Назначают и финансируют выплаты пенсий и социальных выплат. Обрабатывают документацию управлений ПФР о назначении и выплате пенсий и социальных выплат. Контролируют доставку пенсионных и социальных выплат получателям.



# АИС ПФР 2

## Миграция подсистем АИС ПФР

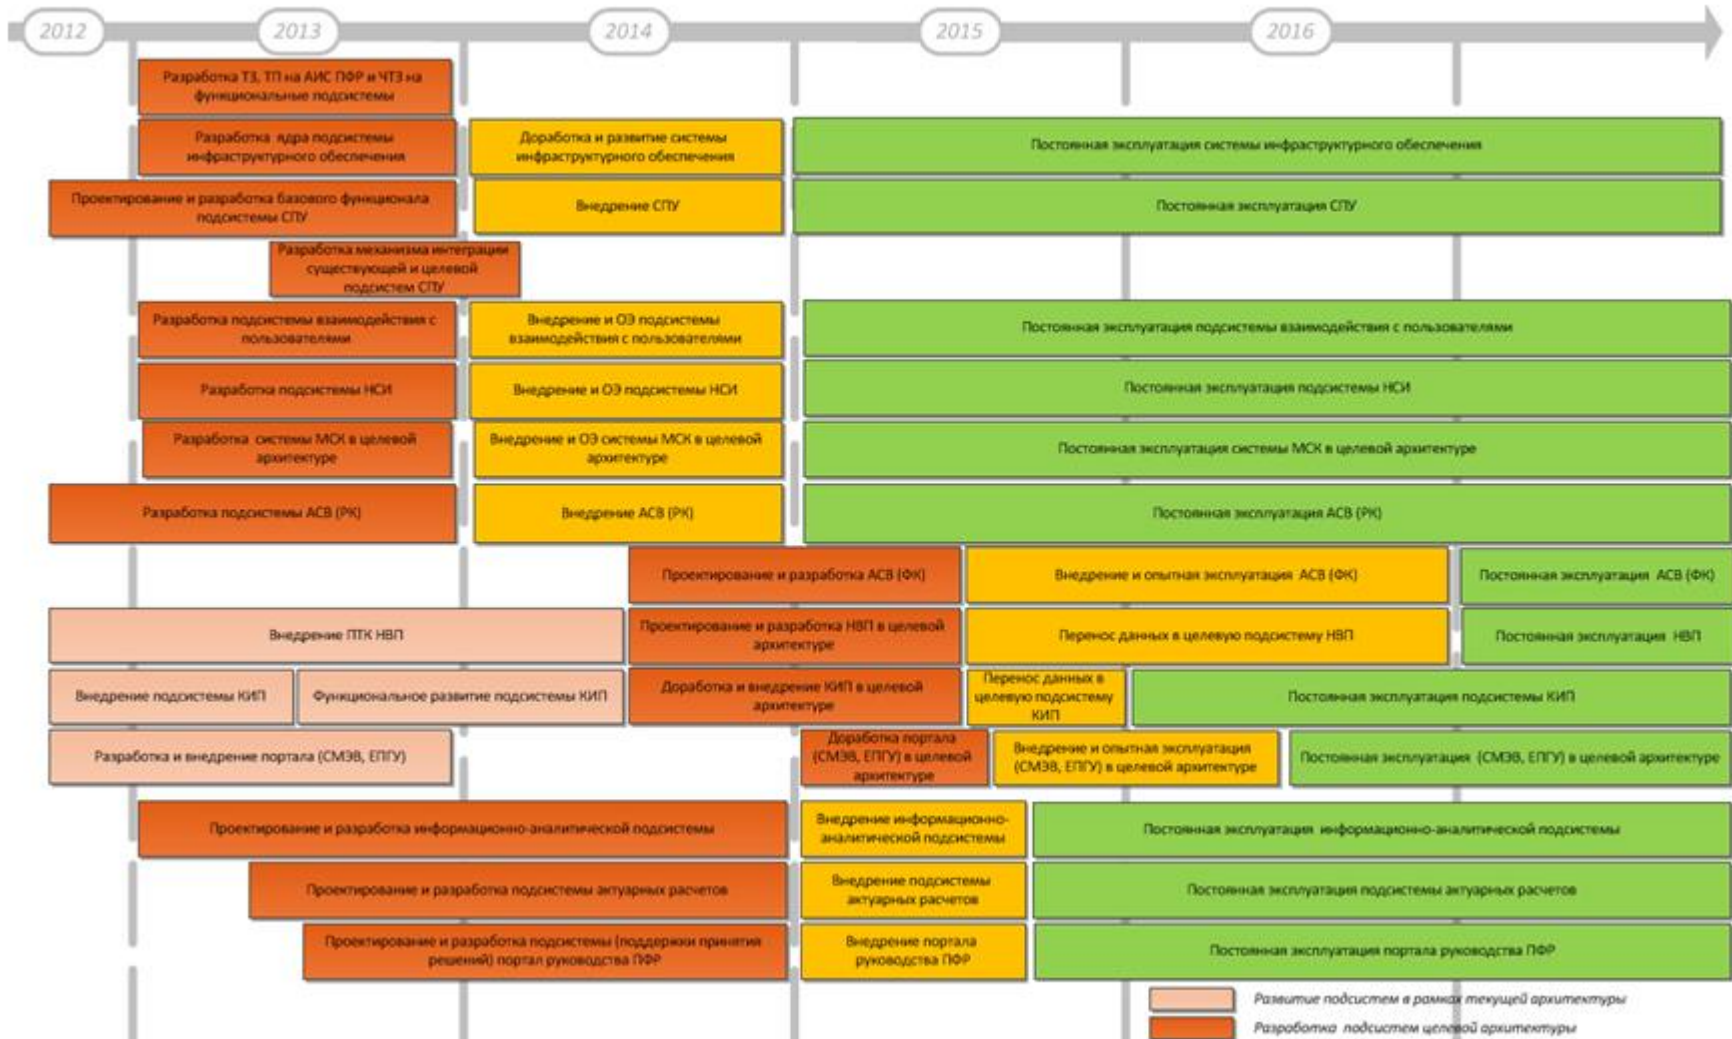

# Этапы внедрения проектного управления в ПФР

## I этап

2014 г.

**ИЦПУ**

## II этап

До конца 2015 г.

**ИТ-блок**

## III этап

2016-2017 гг.

**ПФР**

### Проекты:

- Крым
- ФБДП

### Проекты:

- «Выпуск 0»
- ЭДО с ФССП  
и другие



# Системный подход при внедрении

Разработка  
нормативно-  
правовой базы



Регламент управления проектами и другие  
нормативно-правовые акты  
Создан проектный офис

Разработка и  
внедрение  
автоматизированных  
инструментов



Информационная система управления проектами  
информатизации ПФР



307 проектов, 3300  
контрольных точек

- «Выпуск 0 АИС ПФР-2»
- «Организация электронного документооборота с ФССП России»

Обучение персонала,  
внутренние  
коммуникации и  
продвижение



Обучение: четыре этапа, 400 чел.




«Проектный Олимп»

**Победа** ИЦПУ в 2015 г.  
2016 г. участники – 13 отделений

# ИС управления проектами

(программный модуль компонента «Планирование и контроль мероприятий ИКТ» подсистемы  
Стратегического управления ИТ АИС ПФР – 2)

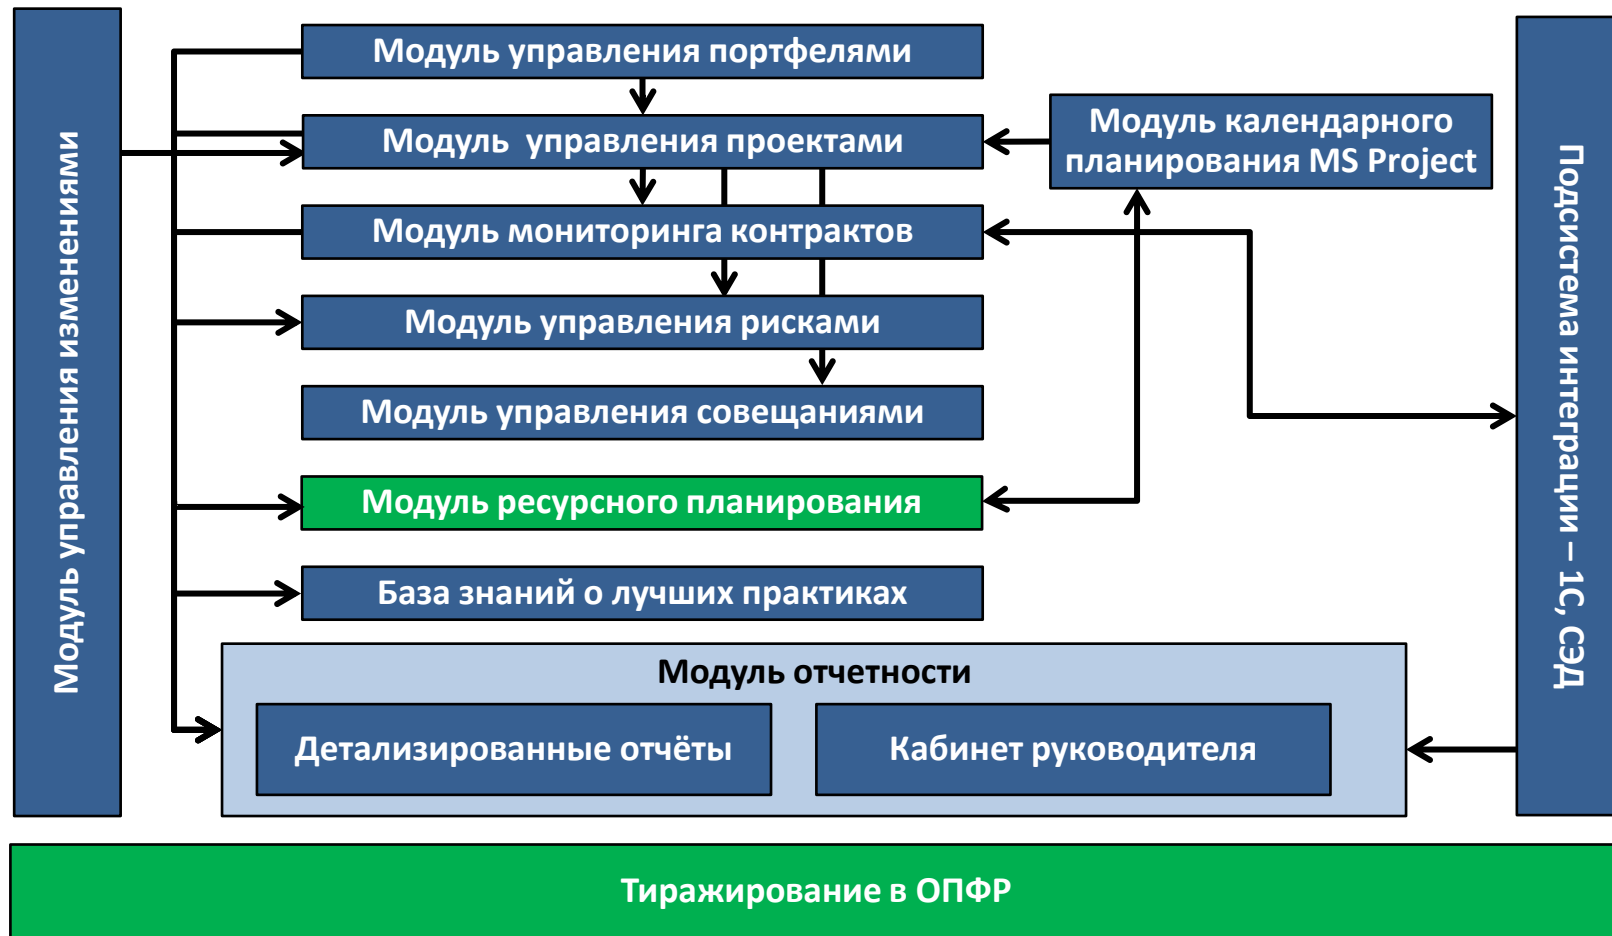


Реализовано


В работе



# ИСУП

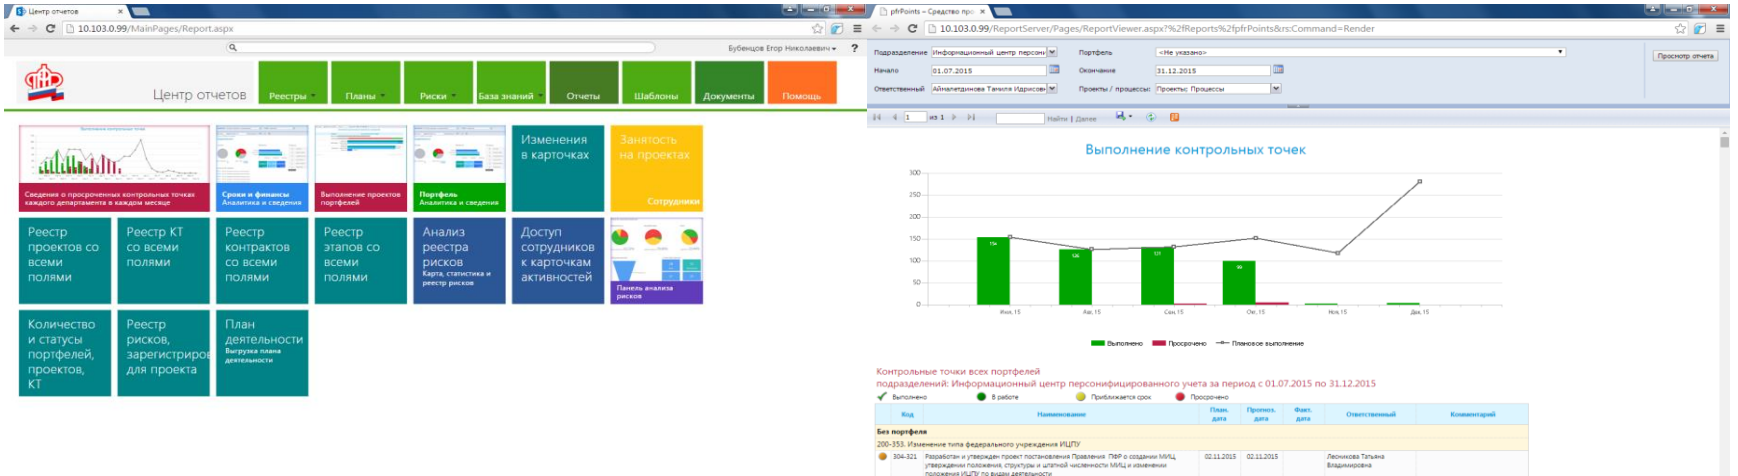

Код	Наименование	Руководитель	Начало (пл.)	Окончание (пл.)
200-217	1.5.1. Обеспечение дополнительной электрической мощности для нужд ЦКЗ 2 АИС ПФР 2	Кабаченко Игорь Иванович	15.12.2015	15.12.2015
200-312	1.1.2. Развитие системы резервного копирования	Корбель Алексей Алоисович	15.11.2015	31.12.2016
200-314	1.1.3. Развитие виртуальной вычислительной инфраструктуры	Корбель Алексей Алоисович	31.12.2015	31.12.2015
200-315	1.1.4. Модернизация ИВС ИДПУ	Корбель Алексей Алоисович	31.12.2015	31.12.2015
200-316	1.1.5. Модернизация ИВС ИДПУ	Корбель Алексей Алоисович	31.12.2015	31.12.2015
200-344	1.1.6. Модернизация ВИС	Корбель Алексей Алоисович	31.12.2015	31.12.2015
200-345	1.1.7. Развитие СКС	Корбель Алексей Алоисович	31.12.2015	31.12.2016
200-349	1.1.8. Идентиф. связи	Корбель Алексей Алоисович	31.12.2005	31.12.2015
200-362	1.1.9. Прочее	Корбель Алексей Алоисович	31.12.2015	31.12.2015
200-006	1.2. Разработка и развитие Портала ПФР (2)			
200-250	1.2.1. Выполнение работ по разработке и созданию оплачиваемой архитектуры Портала ПФР	Курганов Вадим Витальевич	09.04.2015	09.04.2015
200-254	1.2.2. Обеспечение информационного взаимодействия с банками-трансферентами	Курганов Вадим Витальевич	09.04.2015	09.04.2015
900-009	1.3. Проектирование и разработка моделирующего стандарта АИС ПФР (1)			
200-311	1.3.1. - 1.3.3. Выполнение работ по созданию первой очереди моделирующего стандарта. Автомат.	Гощадзе Сергей Юрьевич	10.12.2015	10.12.2015
900-014	1.4. Разработка и создание единой системы информационной безопасности в рамках разработки и внедрения Подсистемы обеспечения информационной безопасности			
200-317	1.4.1. Проведение аттестационных испытаний и аттестация на соответствие требованиям по з.	Фрольченко Максим Вик.	07.08.2015	07.08.2015
200-318	1.4.2. Проведение работ по переезду системы автоматизированной системы Федерального учр.	Лихачев Александр	31.12.2015	31.12.2015
900-017	1.5. Организация проектного управления в ИДПУ и ИД в рамках создания Центра управления ИТ инфраструктурой АИС ПФР 2 (3)			
200-319	1.5.1. Развитие сервисов проектного офиса в части ИДПУ	Бубенцова Егор Николаевич	31.10.2015	31.12.2015
200-320	1.5.3. Развитие и внедрение сервисов проектного офиса в части ИД ПФР	Бубенцова Егор Николаевич	31.12.2015	31.12.2015
200-323	1.5.6. Подготовка и согласование нормативно-правовой базы проектного управления в ИТ-бл.	Кабаченко Алексей Виктор	31.12.2015	31.01.2016
200-373	Обучение	Бубенцова Егор Николаевич	21.04.2015	31.07.2015
200-374	Проектный Офис 2015	Бубенцова Егор Николаевич	01.06.2015	30.10.2015
900-027	1.6. Развитие и модернизация ИС и комплексов УЗК (1)			
200-319	1.6. Развитие и модернизация ИС и комплексов УЗК	Болдов Павел Юрьевич	31.12.2015	31.12.2015
900-028	1.7. Создание ситуационного центра (1)			
200-340	1.7. Создание ситуационного центра	Корбель Алексей Алоисович	30.11.2015	24.07.2016

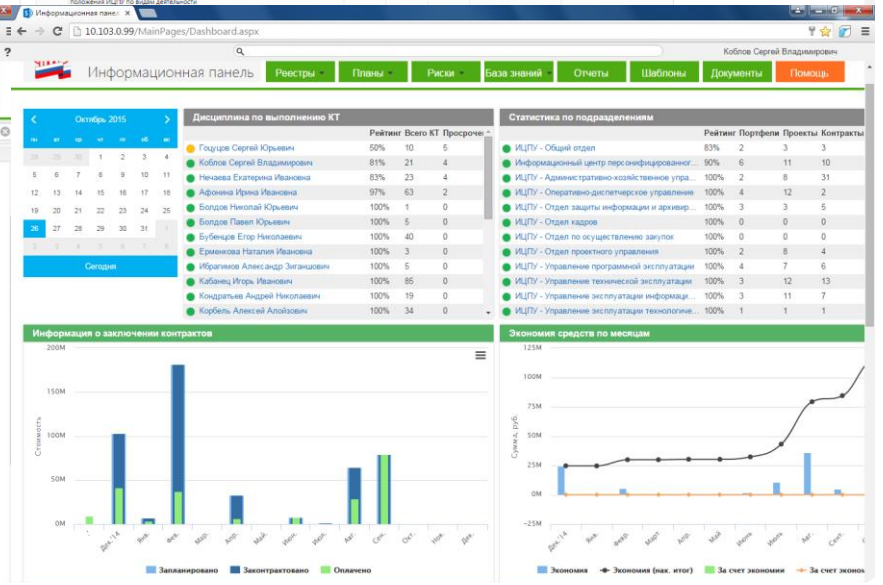



**Спасибо за внимание!**
